

Внедрение системы управления возвратами платежей

Проект по автоматизации и оптимизации процессов в распределённой сети.

Организация:

Отделение СФР по Ростовской области
(2017 — наст. время)

Моя роль:

Руководитель проекта /
Бизнес-аналитик

Масштаб сети:

62 подразделения

Объём:

300+ пользователей |
200 000+ записей



Снижение
финансовых
потерь на 50%




Скорость
отчётности:
14 дней →
2 секунды

Проблема: Разрозненный учёт и отсутствие прозрачности


В 62 территориальных подразделениях учёт вёлся без единого регламента (Excel, бумага, 1С). Контроль требовал ручных запросов и выездных проверок, что вело к высоким рискам ошибок и финансовых потерь.

Карта хаоса

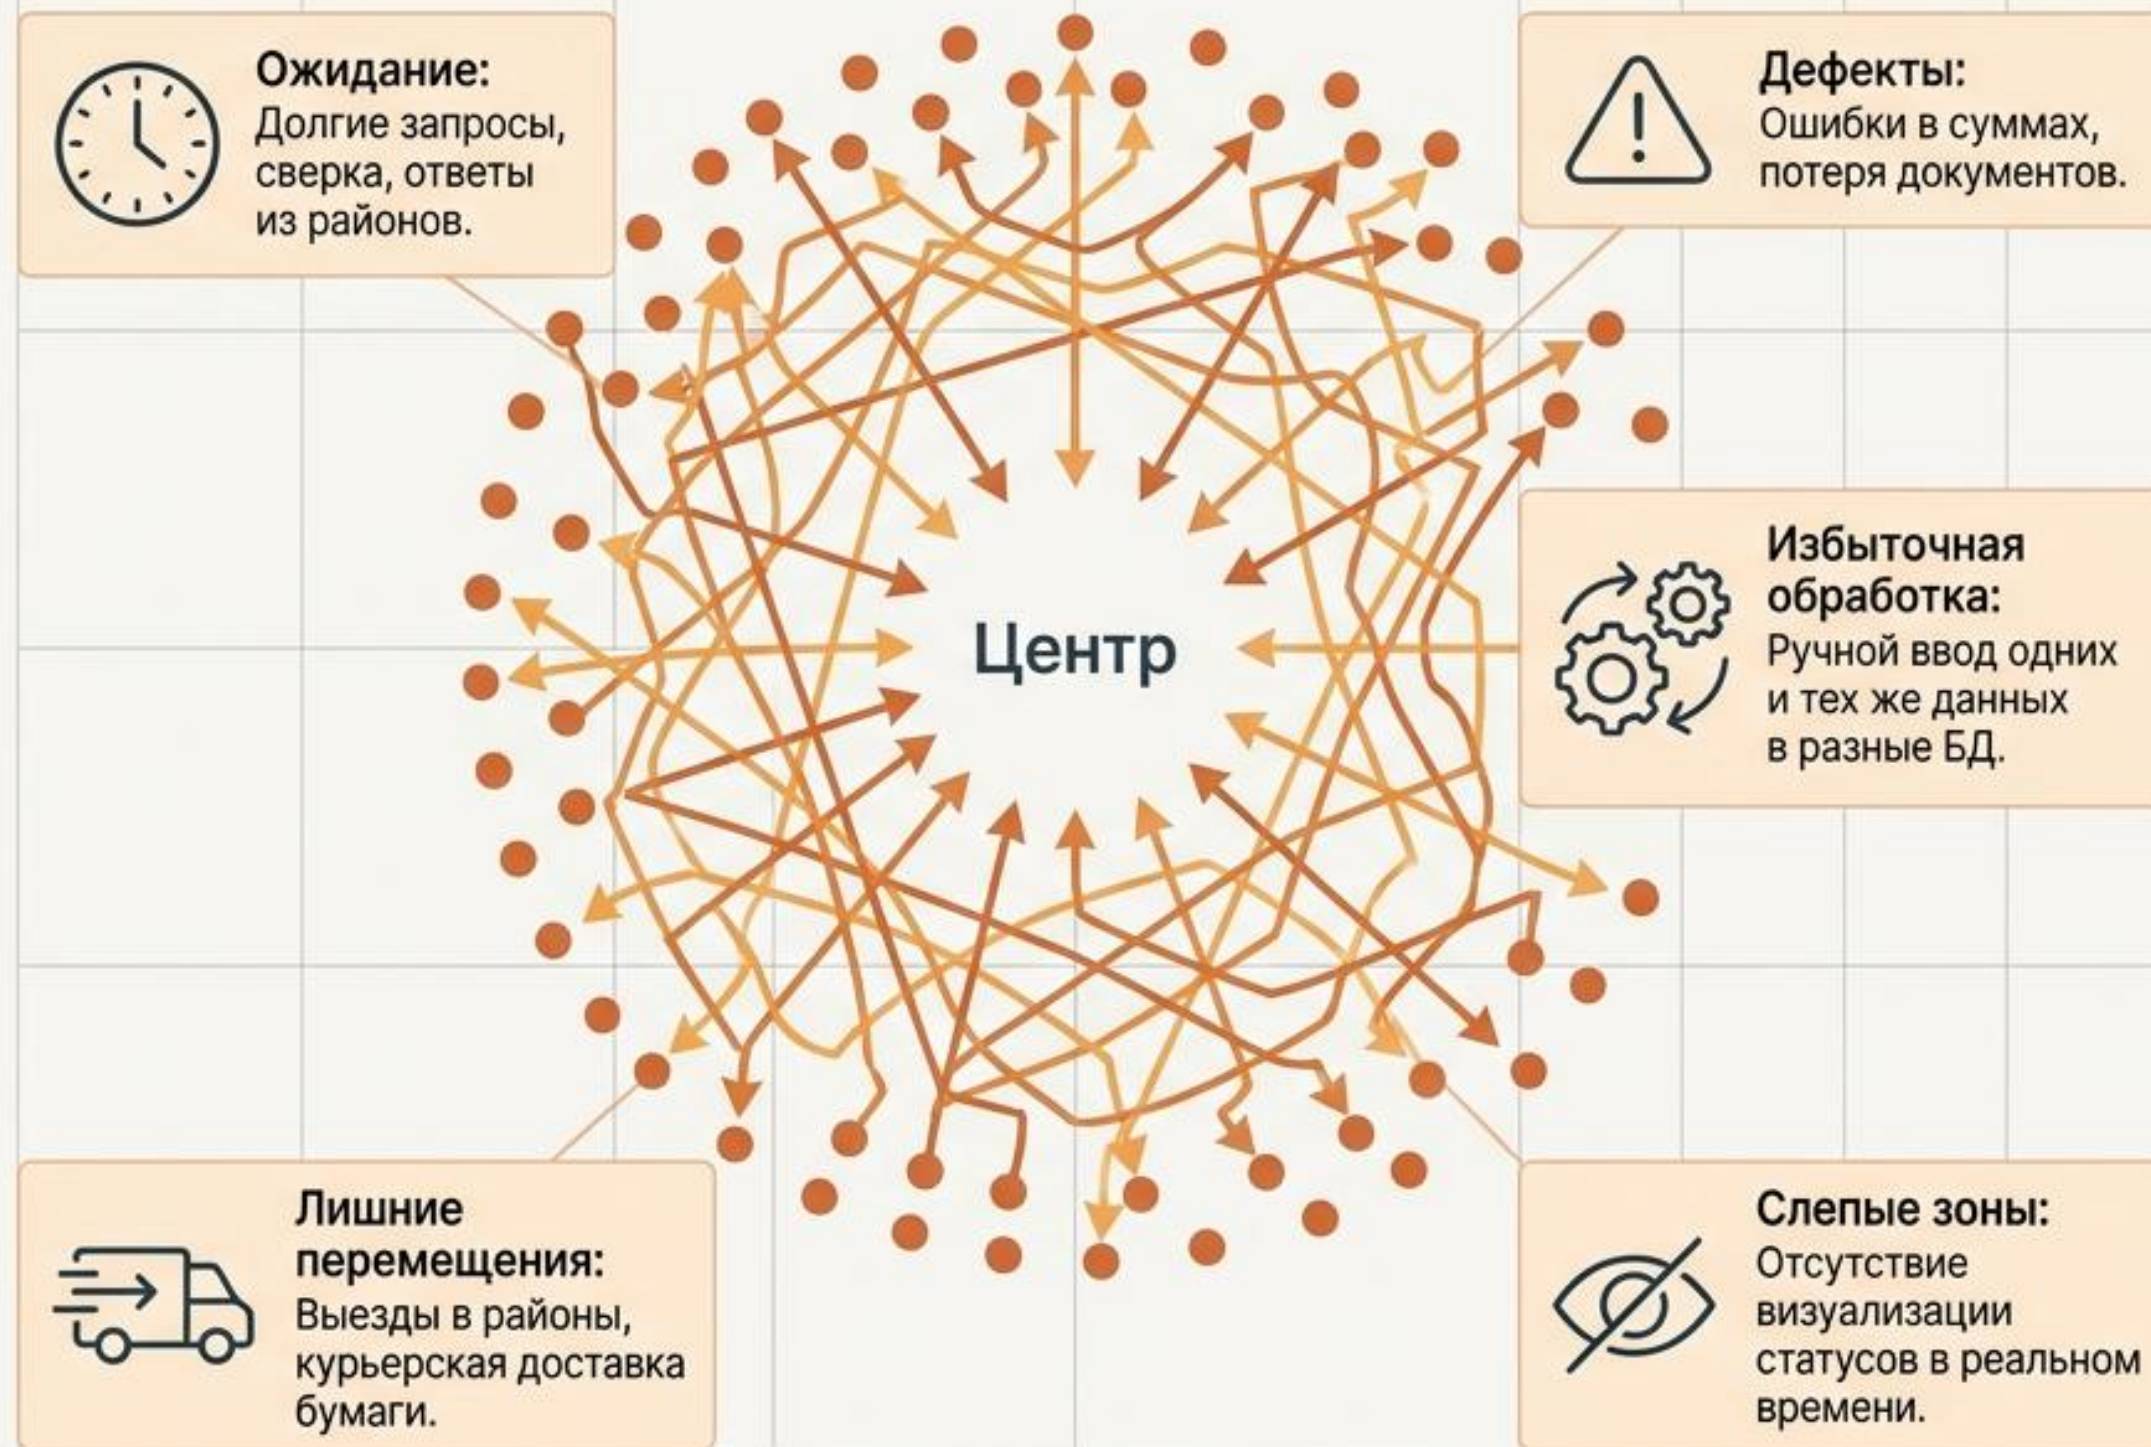


Стратегическая цель: Создать единую прозрачную систему контроля

AS-IS: Хаос и ручной контроль

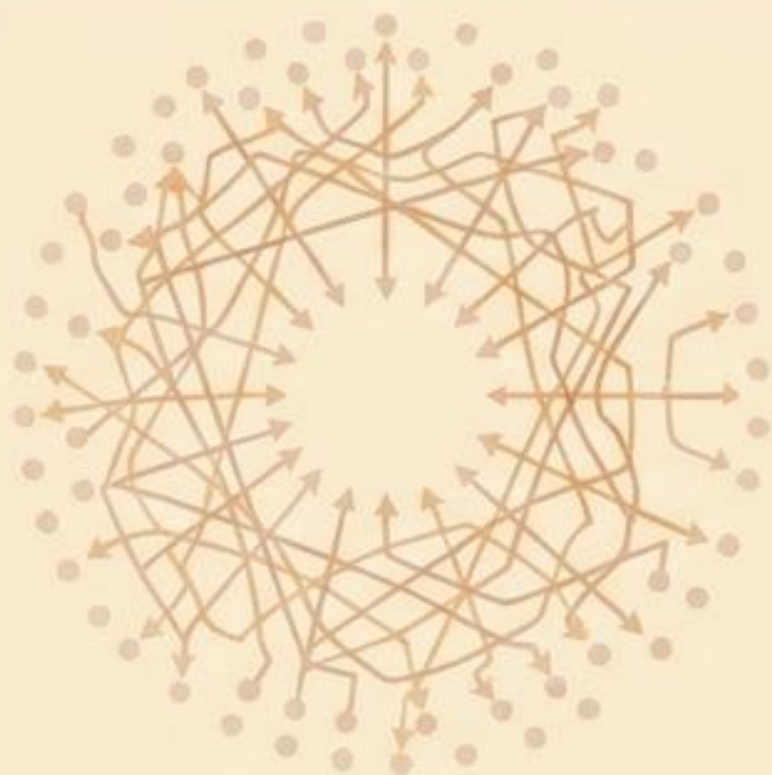

TO-BE: Централизованная экосистема

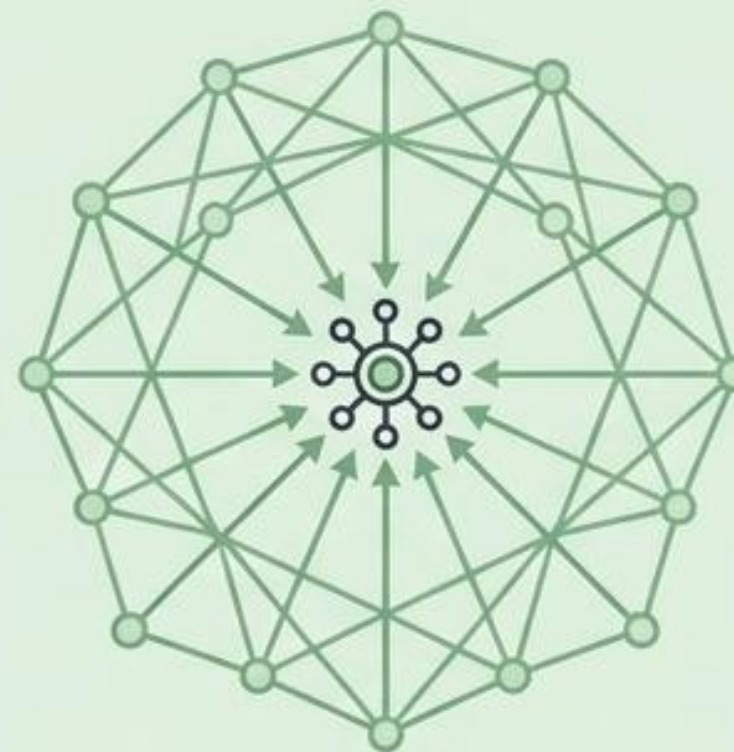

Единый центр:
Централизованный учёт
возвратов платежей.



100% Прозрачность:
Сквозной контроль на
всех этапах процесса.



Автоматизация:
Исключение рутины и
генерация документов.



Данные Live:
Доступ руководства к
актуальным метрикам
в реальном времени.



Защита бюджета:
Кардинальное снижение
необоснованных
платежей.

Архитектура управления: Моя роль в экосистеме проекта




Картирование потока (AS-IS)

Общий цикл отчётности: 10–14 дней



Lean-инструменты, которые применили в проекте



VSM (Картирование потока)

Проанализировали текущий процесс, выявили узкие места, спроектировали целевое состояние.



Стандартизация (SOP)

Разработали единую жесткую инструкцию и регламент работы для всех 62 подразделений.




Визуальный менеджмент

Внедрили сквозную цветовую индикацию: мгновенное понимание статуса (в работе / на согласовании / закрыто).



Канбан-подход

Использовали статусы и жесткие сроки для управления очередностью и моментального выявления зависших задач.



Pull System (Тянущий контроль)

Настроили автоматическую выборку карточек без движения для точечной, адресной отработки.



Автоматизация

Полностью исключили ручные операции (генерация типовых документов и формирование сводных отчётов).


Целевая модель (TO-BE): От хаоса к непрерывному потоку

Общий цикл отчётности: 2 секунды



Целевая модель (ТО-ВЕ) в нотации BPMN


ИВС — излишне выплаченные средства

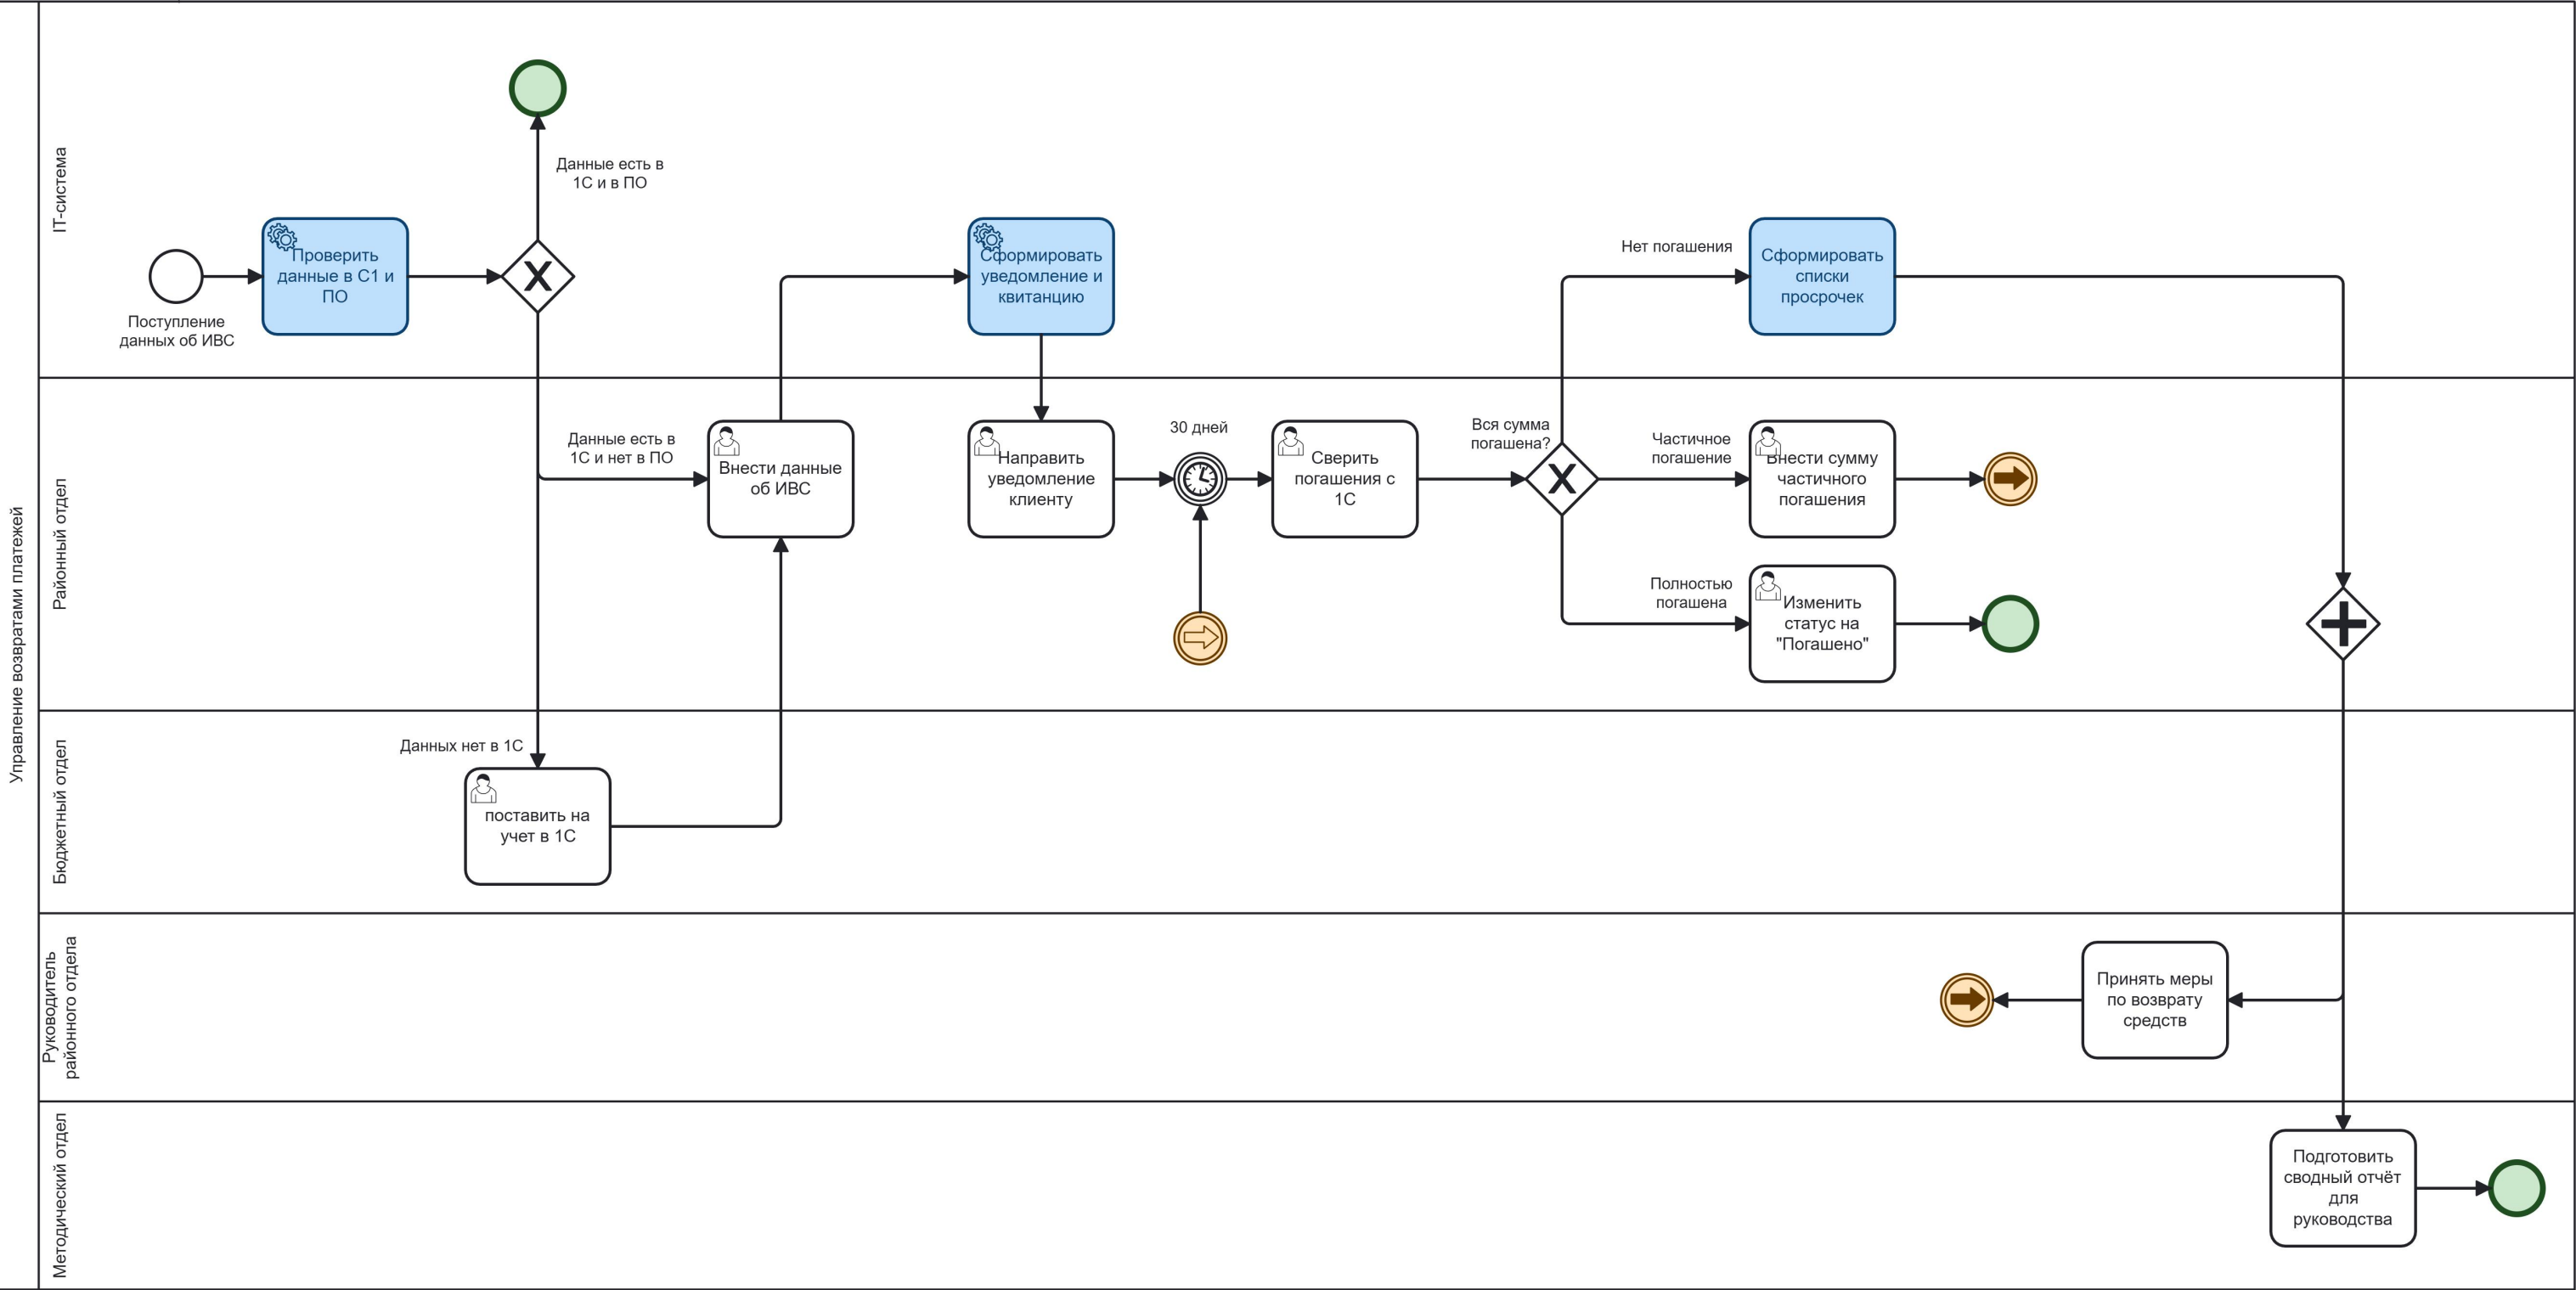

Результаты проекта: что изменилось

Показатель	До внедрения	После внедрения
Финансовые потери	Базовый уровень (Высокий риск)	Снижение необоснованных платежей на 50% 
Время отчётности	10–14 дней 	2 секунды (Автовыгрузка) 
Трудозатраты на документ	30 минут (Ручной ввод)	10 секунд (Автогенерация)
Ошибки в учёте	~30% 	< 5% 
Прозрачность статусов	0% (Слепая зона)	100% (Цветовая индикация) 

Синтез опыта: философия успешной трансформации



T3 + Прототип = Предсказуемость

Инвестиции в детализированное техническое задание и визуальный прототип экономят месяцы переделок на этапе разработки.



Пилотирование обязательно

Запуск на одной площадке позволяет выявить скрытые системные конфликты и отработать до полномасштабного развертывания на 62 филиала.



Польза побеждает сопротивление

Масштабные изменения всегда вызывают трение. Лучший способ продать систему пользователям — показать, как она моментально избавляет их от рутины.



Lean в офисе работает

Инструменты бережливого производства (VSM, Kanban) применимы не только на заводах, но и дают кратный рост эффективности в административных процессах.



Управление изменениями

Успех зависит не только от кода. Обучение, методическая поддержка и эмпатия к пользователям — фундамент бесшовного внедрения.

Проект показал, что системный подход, владение Lean-инструментами и умение работать с людьми и IT позволяют добиваться измеримых результатов даже в сложных распределённых структурах

Олеся Демченко

☎ +7 (961) 275-52-50

✉ dem_82@bk.ru

📌 @olesiarem29

Ссылка на GitHub-проект
(справочник по Lean)

